

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE · CONFIDENTIEL · JUILLET 2026

Feuille de route financière

La situation financière complète du projet, du premier dollar épargné au Canada jusqu'à l'entreprise autofinancée à Dakar. Combien ça coûte, d'où vient l'argent, quand ça devient rentable, et ce qui doit rester vrai en chemin.

3 500 \$

INVESTISSEMENT
PERSONNEL TOTAL (≈
2 135 000 CFA)

Mois 3

PREMIÈRE MARGE
MENSUELLE POSITIVE

Mois 6

DERNIER APPORT
PERSONNEL — ENSUITE
LE BUSINESS SE
FINANCE SEUL

L'essentiel en une page

Ce document répond à cinq questions, dans l'ordre : **d'où vient l'argent** (partie 1), **combien coûte le lancement** (partie 2), **comment un client rapporte** (partie 3), **comment le projet évolue sur 24 mois** (parties 4-5), et **qu'est-ce qui pourrait mal tourner** (partie 6). Il se lit avec son compagnon, le fichier Excel *ScentSenegal_Modele_Financier.xlsx*, où chaque hypothèse est modifiable.

ARGENT PERSONNEL INVESTI

3 500 \$

≈ 2 135 000 CFA — étalés sur 9 mois, sans dette ni investisseur

CAPITAL AU LANCEMENT

1 000 \$

≈ 610 000 CFA disponibles le jour J (mois 4 du plan personnel)

MARGE PAR CLIENT

70-73 %

de chaque abonnement reste après huiles, visites et logistique

RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE

Mois 3

le business couvre ses propres coûts (scénario de référence)

INDÉPENDANCE FINANCIÈRE

Mois 6

dernier virement personnel — la croissance est ensuite payée par les marges

TRÉSORERIE À 24 MOIS

21,38 M

CFA en caisse (référence) — soit ≈ 10× l'argent personnel investi

Cinq mots à connaître (tout le document repose dessus)

Terme	Ce que ça veut dire ici
Capital	L'argent versé sur le compte business. Il ne t'appartient plus : c'est celui de ScentSenegal.
Trésorerie	Ce qu'il y a en caisse à la fin du mois. C'est LE chiffre de survie : s'il touche zéro, tout s'arrête.
Marge brute	Ce qui reste d'un abonnement une fois payés les huiles, les visites, la logistique et les frais fixes du mois.
CapEx	Achat de matériel (diffuseurs, onduleur). Payé une fois, AVANT que le client ne rapporte quoi que ce soit.
Autofinancement	Le moment où les marges paient seules les nouveaux équipements — plus besoin du salaire personnel.

Comment lire les mois

Le plan personnel compte à partir d'aujourd'hui (lancement au « mois 4 »). La projection business compte à partir du lancement : **M1 = premier mois d'activité à Dakar** = mois 4 du plan personnel. Les deux calendriers sont rappelés à chaque étape.

La situation personnelle de départ

Le projet est financé par une seule source : **l'épargne d'un revenu étudiant stable au Canada**. Pas de prêt, pas d'investisseur, pas de famille sollicitée. C'est plus lent qu'une levée de fonds, mais personne ne peut réclamer cet argent, et aucun échec ne crée de dette.

Élément	Montant	Note
Salaire (aux 2 semaines)	900 \$	Revenu étudiant stable
Salaire mensuel approximatif	≈ 1 950 \$	Environ 2,17 paies par mois
Charges mensuelles maximum	300 \$	Logement, transport, etc.
Capacité d'épargne théorique	≈ 1 650 \$/mois	Avant ajustement réaliste
Épargne réaliste retenue	≈ 1 000 \$/mois	Avec marge pour les imprévus et la vie

La règle des 3 enveloppes — chaque 1 000 \$ épargné se répartit ainsi

SÉCURITÉ PERSONNELLE

30 % · 300 \$

Fait grossir le coussin de sécurité. Intouchable par le business, quoi qu'il arrive.

CAPITAL BUSINESS

50 % · 500 \$

Viré sur le compte séparé ScentSenegal. C'est le seul argent que le projet a le droit de risquer.

VIE & IMPRÉVUS

20 % · 200 \$

Loisirs et imprévus personnels — ce qui permet de tenir des mois sans s'épuiser.

La règle d'or absolue

Avant le premier dollar investi : un **coussin de sécurité personnel de 1 500 à 2 000 \$**, constitué pendant les mois 1-2, sur un compte séparé. Il n'entre **jamais** dans le business. Le business se construit avec l'argent qu'on peut se permettre de perdre — jamais avec le filet de sécurité.

Les 6 règles d'or financières du projet

#	Règle	Pourquoi
1	Compte bancaire séparé pour le business	On sait toujours où on en est ; les finances perso sont protégées
2	Coussin perso intouchable avant tout	Aucun imprévu ne peut mettre à terre
3	Ne jamais puiser dans la réserve de sécurité	C'est un filet, pas un capital de jeu
4	Réinvestir les bénéfices, pas ajouter du salaire	Le business doit apprendre à se financer seul
5	Garder 20 % de l'épargne pour sa vie	Tenir sur la durée sans s'épuiser
6	Constance plutôt que vitesse	La discipline mensuelle bat les coups d'éclat

Quatre mois pour se mettre en position de force

Sécurité d'abord

Plan personnel · Mois 1-2

- 100 % de l'épargne va au coussin personnel → objectif **1 500-2 000 \$**
- Le business attend — c'est voulu. Pendant ce temps : recherche fournisseurs, contact local à Dakar, plan d'action

Capitalisation

Plan personnel · Mois 3-4

- La règle des 3 enveloppes s'active : **500 \$/mois** partent vers le compte business
- Mois 3 (≈ 305 000 CFA en caisse) : commande des diffuseurs et des 5 huiles de test
- Mois 4 (≈ 610 000 CFA) : tests au Canada, expédition vers Dakar — **LANCEMENT**

Conditions de lancement (les 3 en même temps) : coussin perso ≥ 1 500 \$ ✓ · capital business ≥ 1 000 \$ ✓
· contact local à Dakar confirmé et engagé ✓

Le calendrier de capitalisation, mois par mois

Période (plan perso)	Capital business cumulé	Équivalent CFA	Ce que ça permet
Mois 1-2	0 \$ (phase sécurité)	—	Coussin perso + préparation complète
Mois 3	≈ 500 \$	≈ 305 000	Commander diffuseurs + 5 huiles de test
Mois 4	≈ 1 000 \$	≈ 610 000	LANCEMENT : test Canada + expédition Dakar
Mois 5	≈ 1 500 \$	≈ 915 000	Premiers clients en essai + réserve solide
Mois 6	≈ 2 000 \$	≈ 1 220 000	Réserve de sécurité + clients couverts
Mois 9 — dernier apport	≈ 3 500 \$	≈ 2 135 000	Croissance autofinancée — on n'ajoute plus

Pourquoi ce rythme est une force

Une capacité d'épargne de 1 000 \$/mois vaut mieux qu'un capital ponctuel : elle autorise à apprendre, se tromper et ajuster sans pression. Si un mois est plus serré, on ralentit sans culpabiliser ; si un mois est meilleur, on accélère. La clé n'est pas la vitesse, c'est la **constance** — et la séparation stricte argent business / argent personnel.

Repère de change utilisé partout

1 \$ CAD ≈ 610 CFA. Une variation de ±5 % du taux change les montants CFA d'autant — le fichier Excel permet de l'ajuster en une cellule.

Où va le premier capital de 1 000 \$

Au lancement (M1 d'activité), le capital de 610 000 CFA se découpe en un **kit de démarrage** dépensé immédiatement et une **réserve** conservée pour les imprévus.

Poste	Montant CFA	Équivalent CAD
3× diffuseurs SS100 compacts (pour les premiers clients)	≈ 79 000	≈ 130 \$
1× diffuseur SS200 grand format (démonstrations Prestige)	≈ 67 000	≈ 110 \$
1× onduleur UPS 500W (anti-coupures de courant)	≈ 35 000	≈ 58 \$
5 flacons d'huiles 500 ml (une par senteur signature)	≈ 55 000	≈ 90 \$
Expédition DHL Canada → Dakar	≈ 80 000	≈ 130 \$
Matériel de présentation + cartes de visite	≈ 20 000	≈ 33 \$
Site web minimal + nom de domaine	≈ 15 000	≈ 25 \$
TOTAL DÉPENSÉ AU LANCEMENT	≈ 351 000	≈ 576 \$
RÉSERVE BUSINESS CONSERVÉE	≈ 259 000	≈ 424 \$

Ce que le kit permet déjà

Les 3 SS100 équipent les **2-3 premiers clients** sans nouvel achat, le SS200 sert aux démonstrations Prestige, et les 5 flacons couvrent essais et démonstrations. Les premiers mois de croissance sont donc **déjà payés** le jour du lancement.

Poste non budgété : la douane

Le budget initial ne prévoit pas les droits d'import sénégalais. Estimation prudente : ≈ 20 % de la valeur du matériel et des huiles (≈ 236 000 CFA), soit **≈ 47 000 CFA** à l'arrivée — absorbable par la réserve de 259 000, mais à vérifier **avant** l'expédition. Toute la suite du modèle applique +20 % sur chaque matériel importé.

Règles de gestion dès le jour 1

Garde-fou	Application concrète
Plancher de trésorerie : 300 000 CFA	Si la caisse passe sous ce seuil → gel des nouvelles installations jusqu'à remontée. On ne compense jamais avec l'argent personnel au-delà du plan.
Un client = du matériel payé d'avance	Chaque signature déclenche un CapEx (31 560 à 185 520 CFA selon le forfait). On n'installe que si la caisse le permet, réserve comprise.
Essai gratuit court : 7 jours	Décision commerciale récente (contre 21-30 jours initialement) : 3× moins de temps où le matériel est déployé sans revenu. Le modèle reste prudent : premier paiement le mois suivant l'installation.

Comment un client rapporte de l'argent

ScentSenegal vend un **abonnement mensuel fixe** (les diffuseurs restent notre propriété). Chaque client suit le même cycle :

Étape	Ce qui se passe	Effet sur la caisse
1. Rendez-vous	Visite de l'hôtel, évaluation des espaces, recommandation d'un forfait	Coût de déplacement minime
2. Essai 7 jours	Installation immédiate, sans contrat — l'hôtel juge sur pièce	Matériel + huiles avancés par nous
3. Signature	Engagement 12 mois (Découverte, Confort) ou 24 mois (Prestige)	CapEx du matériel définitif
4. Abonnement	Paiement mensuel fixe, à partir du mois suivant l'installation	+ Revenu récurrent
5. Service mensuel	Recharge des huiles, visites d'entretien, ajustements	– Coûts variables mensuels

Les prix de revient unitaires (tout ce que le business paie)

Élément	Coût	Détail
Flacon d'huile 500 ml	11 000 CFA	Achat par lot de 5 (55 000 CFA) ; un flacon $\approx$ 3-4 semaines de diffusion
Visite terrain (recharge / entretien)	5 000 CFA	Transport + temps de l'opérateur local — à caler avec le contact de Dakar
Logistique d'import des huiles	8 000 CFA / client / mois	Part de l'envoi groupé (DHL/fret) + douane des huiles, répartie par client
Frais fixes mensuels	15 000 CFA / mois	Téléphone, site, déplacements de prospection, petits frais — dès M1
Diffuseur SS100 rendu posé	31 560 CFA	26 300 CFA + 20 % de douane
Diffuseur SS200 rendu posé	80 400 CFA	67 000 CFA + 20 % de douane
Onduleur UPS rendu posé	42 000 CFA	35 000 CFA + 20 % de douane (clients Prestige)

Le point structurel à ne jamais oublier

Le matériel se paie **avant** le premier franc encaissé, et l'essai gratuit ajoute un mois de décalage.


Conséquence : **chaque nouveau client consomme de la trésorerie avant d'en rapporter**. C'est pour cela que le rythme d'acquisition — et non l'envie — est piloté par la caisse (partie 5).

L'économie d'un client, forfait par forfait

Forfait	Abonnement	Huiles	Visites	Logistique	Marge brute	Marge %	Matériel	Remboursé en
Découverte	80 000	-11 000	-5 000	-8 000	56 000	70%	31 560	0.6 mois
Confort	150 000	-22 000	-10 000	-8 000	110 000	73%	63 120	0.6 mois
Prestige	300 000	-55 000	-20 000	-8 000	217 000	72%	185 520	0.9 mois

Matériel initial : douane de 20 % incluse. Découverte = 1 SS100 · Confort = 2 SS100 · Prestige = 1 SS200 + 2 SS100 + 1 UPS. Les frais fixes (15 000 CFA/mois) sont communs à toute l'entreprise et comptés dans les projections, pas par client.

Pour 100 CFA encaissés, où va l'argent ?

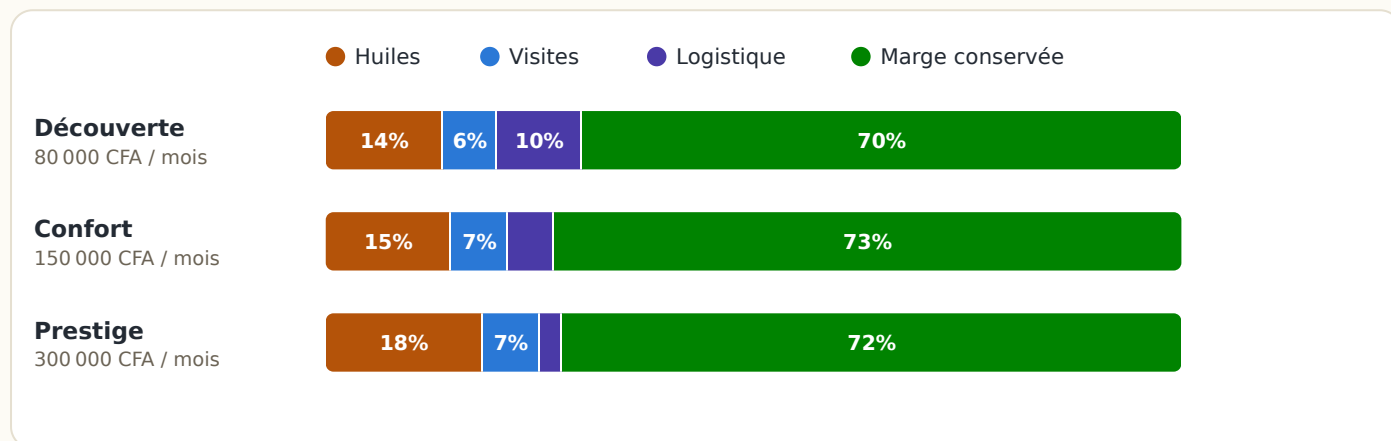

Ce que ça veut dire

Environ **70 % de chaque abonnement reste dans l'entreprise** après les coûts directs, et le matériel d'un client est remboursé par sa **première mensualité** (0,6 à 0,9 mois). C'est un moteur économique inhabituellement sain — tant que les coûts terrain restent proches des estimations.

Fragilité assumée

Ces marges reposent sur 3 chiffres encore estimés : la visite à 5 000, la logistique à 8 000/client et la douane à 20 %. Si la réalité les double, la marge Découverte passe de 70 % à ≈ 48 % — le projet reste viable, mais la croissance ralentit. D'où la partie 6 : valider ces chiffres en priorité.

Les quatre phases de l'entreprise

Prouver que ça marche

M1 – M3 · Pilote

- Objectif : **3-4 hôtels en essai, 2 clients signés** (Découverte d'abord — matériel du kit, zéro CapEx)
- Premières recharges, premiers retours, premières photos et témoignages
- Jalon financier : **première marge mensuelle positive au M3**

Porte de sortie de phase : 2 clients payants réguliers + un opérateur terrain fiable + coûts réels confirmés (visite, douane, logistique). Tant que ce n'est pas vrai, on n'accélère pas.

Un client de plus chaque mois

M4 – M6 · Croissance accompagnée

- Rythme cible : **≈ 1 signature/mois**, premiers clients Confort (2 espaces)
- Les derniers apports personnels (305 000 CFA/mois) sécurisent la caisse pendant l'accélération
- Jalon : **M6 = dernier virement personnel** — total investi depuis le début : 2 135 000 CFA (3 500 \$)

Porte de sortie : 5 clients actifs, revenu $\approx$ 390 000 CFA/mois, trésorerie $\geq$ 2 083 760 CFA — le business vole de ses propres ailes.

La marge paie la croissance

M7 – M12 · Autofinancement

- Chaque nouveau matériel est payé par les marges du mois — **plus un franc personnel n'entre**
- Premier client **Prestige** visé vers M12 (senteur signature exclusive, engagement 24 mois)
- Jalon : le lancement (kit de 351 000) est intégralement remboursé par les marges au **M6** ; la valeur créée dépasse le total investi au **M7**

Porte de sortie : 11 clients actifs, revenu $\approx$ 1 080 000 CFA/mois, trésorerie $\approx$ 4 966 720 CFA.

Devenir la référence à Dakar

M13 – M24 · Consolidation

- Cap : **23 clients** sur les 35+ hôtels ciblés ($\approx$ 65 % du marché cible)
- Renforcement : opérateur mieux rémunéré, stock tampon d'huiles (1 mois), unités de rechange
- Choix stratégiques financés par la caisse : salarier l'équipe terrain, statut juridique complet, 2e vague marketing

À 24 mois (référence) : revenu $\approx$ 2 760 000 CFA/mois · marge $\approx$ 1 888 000 CFA/mois · trésorerie $\approx$ 21 377 840 CFA.

La projection de référence, mois par mois

Scénario de référence : $\approx$ 1 nouveau client/mois (majorité Découverte, Confort un mois sur deux à partir de M4, 3 Prestige en 2 ans). Paiement à partir du mois suivant l'installation, aucune résiliation pendant l'engagement.

Mois	Clients actifs	...dont payants	Revenu /mois	Marge brute	CapEx	Apport perso	Trésorerie fin de mois
M1	0	0	0	-15 000	351 000	0	244 000
M2	1	0	0	-39 000	0	305 000	510 000
M3	2	1	80 000	17 000	0	305 000	832 000
M6	5	4	390 000	223 000	63 120	305 000	2 083 760
M9	8	7	770 000	515 000	31 560	0	3 210 520
M12	11	10	1 080 000	678 000	63 120	0	4 966 720
M18	17	16	1 920 000	1 283 000	185 520	0	11 357 280
M24	23	22	2 760 000	1 888 000	185 520	0	21 377 840

M1 : le CapEx de 351 000 est le kit de lancement. Marges négatives en M1-M2 : les frais tournent avant les premiers paiements — c'est le passage à vide prévu, couvert par capital + apports. Point le plus bas de toute la trajectoire : **244 000 CFA au M1**, juste après l'achat du kit — brièvement sous le plancher de 300 000, le temps que l'apport du M2 (305 000) reconstitue la marge de sécurité. C'est le seul moment de fragilité du plan : aucune dépense imprévue ne doit s'y ajouter.

Les trois seuils de rentabilité — à retenir

1 · RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE

Mois 3

Les abonnements couvrent tous les coûts du mois (huiles, visites, logistique, fixes). Le business ne « brûle » plus d'argent au quotidien.

2 · LANCEMENT REMBOURSÉ

Mois 6

Les marges cumulées dépassent le kit de lancement (351 000 CFA). L'investissement matériel initial est effacé.

3 · VALEUR NETTE CRÉÉE

Mois 7


La trésorerie dépasse le total d'argent personnel injecté (2 135 000 CFA). Au-delà, chaque mois enrichit réellement le projet.

Lecture honnête du résultat à 24 mois

Trésorerie $\approx$ 21 377 840 CFA pour 2 135 000 CFA investis, soit $\approx$ **10x la mise en 2 ans** — si le rythme d'un client/mois et les coûts estimés tiennent. Ce n'est pas une promesse : c'est ce que les hypothèses actuelles impliquent. Les scénarios encadrants (page suivante) montrent ce qui se passe si la réalité est plus lente ou plus rapide.

Trois vitesses possibles, une même trajectoire

Mêmes prix, mêmes coûts, même financement (2 135 000 CFA au total) — seule change la vitesse d'acquisition des clients.

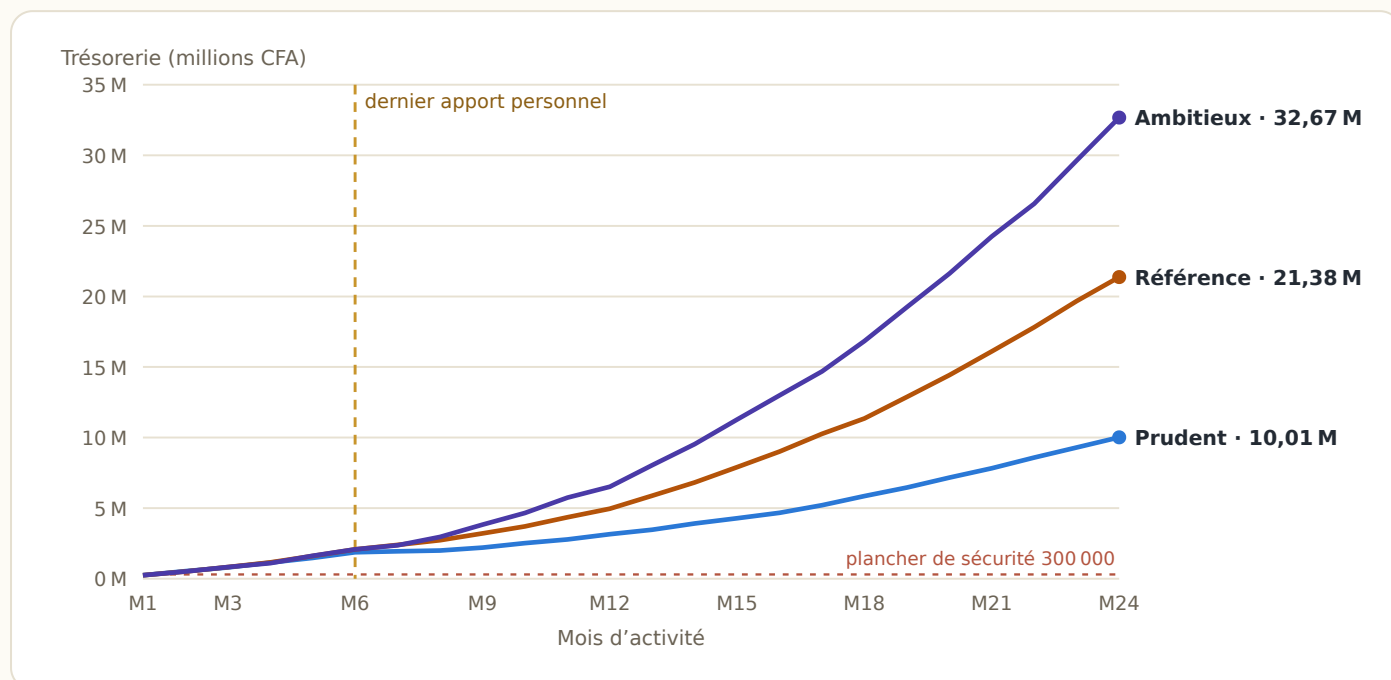

Scénario	Clients M24	Revenu M24	Marge M24	1 ^{re} marge +	Tréso. minimum	Trésorerie M24
● Prudent	14	1 180 000	781 000	M4	244 000 (M1)	10 014 160
● Référence ★	23	2 760 000	1 888 000	M3	244 000 (M1)	21 377 840
● Ambitieux	38	4 460 000	3 121 000	M3	244 000 (M1)	32 668 800

Prudent — la moitié du rythme

Un client tous les deux mois seulement : le projet reste **rentable et autofinancé**, simplement plus lent. La trésorerie ne descend jamais sous ≈ 244 000 CFA. Autrement dit : même si la vente est deux fois plus dure que prévu, personne ne perd sa mise — on gagne juste moins vite.

Ambitieux — lire avec recul

38 clients à M24, c'est capturer la quasi-totalité des 35+ hôtels ciblés en 2 ans, avec un seul opérateur terrain au départ. Financièrement, ça passe (minimum 244 000 CFA en M1) ; opérationnellement, c'est le plafond théorique, pas l'objectif de travail.

Le scénario de référence ★ sert de plan de pilotage : les décisions (embauche, stock, 2e vague marketing) se prennent sur ses jalons. Le fichier Excel permet de saisir n'importe quel autre rythme, mois par mois.

Hypothèses à valider et garde-fous

Les 6 hypothèses dont tout dépend — à vérifier dans cet ordre

Hypothèse	Valeur retenue	Comment la vérifier
1. Opérateur terrain à Dakar	visite 5 000 CFA	Accord écrit (rôle, rémunération, remplaçant). C'est la personne la plus critique du projet — sans lui, rien ne tourne.
2. Douane sénégalaise	20 % du matériel	Vérifier les droits réels (code SH des diffuseurs et huiles) avant la première expédition.
3. Logistique des huiles	8 000 /client/mois	Devis d'envoi groupé trimestriel + explorer un fournisseur local/régional (gros levier de marge).
4. Conversion des essais	≈ 1 signature/mois	Se mesure dès le pilote : nombre d'essais → signatures. En dessous, basculer sur le scénario prudent.
5. Durée réelle d'un flacon	3-4 semaines	À confirmer en conditions réelles (climatisation, volumes, réglages) pendant les essais.
6. Zéro résiliation	engagement 12-24 mois	Qualité de service + contrat clair. Chaque départ anticipé = un matériel à réaffecter.

Risques identifiés et parades prévues

Risque	Parade
Opérateur indisponible (maladie, départ)	Former une 2 ^e personne dès la phase pilote ; procédures écrites simples (recharge, réglages).
Rupture de stock d'huiles (retard douane/transport)	Stock tampon d'1 mois dès M7, financé par les marges ; envois groupés anticipés.
Panne de diffuseur chez un client	Unités de rechange (le kit en garde une d'avance) ; remplacement sous 48 h, prévu au contrat.
Client mauvais payeur	Païement en début de mois ; service suspendu après 2 impayés ; le matériel reste notre propriété.
Variation du taux CAD/CFA	Marges ≈ 70 % : une variation de ±10 % du change reste absorbable ; achats groupés pour lisser.
Un concurrent copie le concept	Contrats d'engagement, senteurs signatures exclusives (ligne Cuuraay), marque à déposer (OAPI), avance terrain.

Les 3 garde-fous chiffrés (non négociables)

① Trésorerie business sous **300 000 CFA** → gel des installations. ② Le coussin personnel (1 500 \$+) ne finance **jamais** le business. ③ Aucun apport personnel au-delà des 2 135 000 CFA planifiés — si le business ne tient pas avec ça, on révisé le modèle, pas la mise.

Le projet en dix lignes

1. Un revenu étudiant stable au Canada épargne **≈ 1 000 \$/mois** ; la règle 30/50/20 en dédie 500 \$ au business.
2. Rien ne démarre avant le **coussin personnel de 1 500 \$** — il restera intouchable du début à la fin.
3. Le lancement a lieu au **mois 4** avec 1 000 \$ (≈ 610 000 CFA) : 351 000 de kit, 259 000 de réserve.
4. Le produit est un **abonnement mensuel** (80 000 / 150 000 / 300 000 CFA) avec matériel fourni et essai gratuit de 7 jours.
5. Chaque client laisse **≈ 70 % de marge brute** et rembourse son matériel dès sa première mensualité.
6. Le business couvre ses coûts dès le **M3**, rembourse son lancement au **M6**, dépasse la mise totale au **M7**.
7. L'apport personnel s'arrête au **M6** : total investi 2 135 000 CFA (3 500 \$), jamais davantage.
8. À 24 mois (référence) : **23 hôtels clients**, ≈ 2 760 000 CFA de revenu mensuel, ≈ 21 377 840 CFA en caisse.
9. Même au rythme **prudent** (2× plus lent), le projet reste rentable et ne repasse jamais sous ≈ 244 000 CFA de caisse.
10. Tout repose sur 3 chiffres à valider en priorité : **coût de la visite, douane, logistique** — et sur un opérateur terrain fiable à Dakar.

Les 5 prochaines actions concrètes

✓ Action	Quand
☐ Sécuriser l'accord écrit avec l'opérateur terrain de Dakar (rôle, rémunération par visite, remplaçant)	Avant le lancement
☐ Obtenir les droits de douane réels (diffuseurs + huiles) et 2 devis d'envoi groupé	Avant l'expédition
☐ Vérifier la disponibilité des noms (Teranga, Gorée, Ngor, Lac rose, Cuuraay) auprès de l'OAPI	Pendant la capitalisation
☐ Finaliser le kit (tests au Canada) et le plan des 10 premiers rendez-vous hôteliers	Mois 3-4 du plan perso
☐ Tenir le tableau de bord mensuel (Excel compagnon) : trésorerie, marge, essais → signatures	Chaque fin de mois

Le duo de pilotage

Ce document fixe le cap ; le fichier **ScentSenegal_Modele_Financier.xlsx** sert de tableau de bord vivant : chaque hypothèse (prix, coûts, douane, rythme, taux de change) y est modifiable et recalcule instantanément marges, trésorerie et seuils. Règle d'usage : on met à jour l'Excel avec les chiffres **réels** chaque mois, et on ne prend de décision d'accélération que sur des chiffres réels.

« Constance plutôt que vitesse. La discipline mensuelle bat les coups d'éclat. »
